

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
1		Cronograma -JBS Pedra Preta	80 dias	Qua 17/01/18	Ter 08/05/18	44%			
2	✓	Nº1- Abatedouro Sanitário,Sala de Nicrópcia	5 dias	Qua 17/01/18	Ter 23/01/18	100%			
3	✓	Sistema de Aterramento	3 dias	Qua 17/01/18	Sex 19/01/18	100%			
4	✓	Abertura de piso e vala	8 hrs	Qua 17/01/18	Qua 17/01/18	100%			
5	✓	Haste de aterramento	4 hrs	Qui 18/01/18	Qui 18/01/18	100%			
6	✓	Solda exotérmica	4 hrs	Qui 18/01/18	Qui 18/01/18	100%			
7	✓	Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Sex 19/01/18	Sex 19/01/18	100%			
8	✓	Recomposição de piso	4 hrs	Sex 19/01/18	Sex 19/01/18	100%			
9	✓	Descida a partir do aterramento	1 dia	Seg 22/01/18	Seg 22/01/18	100%			
10	✓	Caixa de inspeção de parede	4 hrs	Seg 22/01/18	Seg 22/01/18	100%			
11	✓	Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Seg 22/01/18	Seg 22/01/18	100%			
12	✓	Conector de medição/Terminal apressão	2 hrs	Seg 22/01/18	Seg 22/01/18	100%			
13	✓	Descida de interligação de captores	1 dia	Ter 23/01/18	Ter 23/01/18	100%			
14	✓	Fixação de Perfis	4 hrs	Ter 23/01/18	Ter 23/01/18	100%			
15	✓	Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Ter 23/01/18	Ter 23/01/18	100%			
16		Nº2 - Administração,Telhado Garagem da Adm.	4 dias	Qua 24/01/18	Seg 29/01/18	25%			
17		Sistema de Aterramento	2 dias	Qua 24/01/18	Qui 25/01/18	0%			
18		Abertura de piso e vala	4 hrs	Qua 24/01/18	Qua 24/01/18	0%			
19		Haste de aterramento	2 hrs	Qua 24/01/18	Qua 24/01/18	0%			
20		Solda exotérmica	2 hrs	Qua 24/01/18	Qua 24/01/18	0%			
21		Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Qui 25/01/18	Qui 25/01/18	0%			
22		Recomposição de piso	4 hrs	Qui 25/01/18	Qui 25/01/18	0%			
23		Descida a partir do aterramento	1 dia	Sex 26/01/18	Sex 26/01/18	0%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
24		Caixa de inspeção de parede	4 hrs	Sex 26/01/18	Sex 26/01/18	0%			
25		Eletroduto	2 hrs	Sex 26/01/18	Sex 26/01/18	0%			
26		Conector de medição	2 hrs	Sex 26/01/18	Sex 26/01/18	0%			
27		Descida de interligação de captores	1 dia	Seg 29/01/18	Seg 29/01/18	100%			
28		Fixação de Perfis	4 hrs	Seg 29/01/18	Seg 29/01/18	100%			
29		Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Seg 29/01/18	Seg 29/01/18	100%			
30		Nº3 - Almoxarifado,Depósito,Caixa depósito Farina	3 dias	Ter 30/01/18	Qui 01/02/18	50%			
31		Sistema de Aterramento	1 dia	Ter 30/01/18	Ter 30/01/18	100%			
32		Abertura de piso e vala	2 hrs	Ter 30/01/18	Ter 30/01/18	100%			
33		Haste de aterramento	2 hrs	Ter 30/01/18	Ter 30/01/18	100%			
34		Solda exotérmica	1 hr	Ter 30/01/18	Ter 30/01/18	100%			
35		Cabo de cobre nu #50	1 hr	Ter 30/01/18	Ter 30/01/18	100%			
36		Recomposição de piso	2 hrs	Ter 30/01/18	Ter 30/01/18	100%			
37		Descida a partir do aterramento	1 dia	Qua 31/01/18	Qua 31/01/18	50%			
38		Caixa de inspeção de parede	2 hrs	Qua 31/01/18	Qua 31/01/18	50%			
39		Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Qua 31/01/18	Qua 31/01/18	50%			
40		Conector de medição/Terminal apressão	4 hrs	Qua 31/01/18	Qua 31/01/18	50%			
41		Descida de interligação de captores	1 dia	Qui 01/02/18	Qui 01/02/18	0%			
42		Fixação de Perfis	4 hrs	Qui 01/02/18	Qui 01/02/18	0%			
43		Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Qui 01/02/18	Qui 01/02/18	0%			
44		Nº4 - Área de Lazer	2 dias	Sex 02/02/18	Seg 05/02/18	75%			
45		Sistema de Aterramento	1 dia	Sex 02/02/18	Sex 02/02/18	100%			
46		Abertura de piso e vala	2 hrs	Sex 02/02/18	Sex 02/02/18	100%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
47	✓	Haste de aterramento	2 hrs	Sex 02/02/18	Sex 02/02/18	100%			
48	✓	Solda exotérmica	1 hr	Sex 02/02/18	Sex 02/02/18	100%			
49	✓	Cabo de cobre nu #50	1 hr	Sex 02/02/18	Sex 02/02/18	100%			
50	✓	Recomposição de piso	2 hrs	Sex 02/02/18	Sex 02/02/18	100%			
51		Descida a partir do aterramento	0,5 dias	Seg 05/02/18	Seg 05/02/18	0%			
52		Caixa de inspeção de parede	1 hr	Seg 05/02/18	Seg 05/02/18	0%			
53		Eletroduto/Perfis Alumínio	1 hr	Seg 05/02/18	Seg 05/02/18	0%			
54		Conector de medição/Terminal apressão	2 hrs	Seg 05/02/18	Seg 05/02/18	0%			
55	✓	Descida de interligação de captores	0,5 dias	Seg 05/02/18	Seg 05/02/18	100%			
56	✓	Fixação de Perfis	2 hrs	Seg 05/02/18	Seg 05/02/18	100%			
57	✓	Instalação de Terminai Aéreos	2 hrs	Seg 05/02/18	Seg 05/02/18	100%			
58		Nº5 - Banco,Bicicletário,Mastro Frente da Unidade	4 dias	Ter 06/02/18	Sex 09/02/18	0%			
59		Sistema de Aterramento	2 dias	Ter 06/02/18	Qua 07/02/18	0%			
60		Abertura de piso e vala	4 hrs	Ter 06/02/18	Ter 06/02/18	0%			
61		Haste de aterramento	2 hrs	Ter 06/02/18	Ter 06/02/18	0%			
62		Solda exotérmica	2 hrs	Ter 06/02/18	Ter 06/02/18	0%			
63		Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Qua 07/02/18	Qua 07/02/18	0%			
64		Recomposição de piso	4 hrs	Qua 07/02/18	Qua 07/02/18	0%			
65		Descida a partir do aterramento	1 dia	Qui 08/02/18	Qui 08/02/18	0%			
66		Caixa de inspeção de parede	4 hrs	Qui 08/02/18	Qui 08/02/18	0%			
67		Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Qui 08/02/18	Qui 08/02/18	0%			
68		Conector de medição/Terminal apressão	2 hrs	Qui 08/02/18	Qui 08/02/18	0%			
69		Descida de interligação de captores	1 dia	Sex 09/02/18	Sex 09/02/18	0%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
70		Fixação de Perfis	4 hrs	Sex 09/02/18	Sex 09/02/18	0%			
71		Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Sex 09/02/18	Sex 09/02/18	0%			
72		Nº6 - Caixa da água,Casa de Bombas Metálicas	4 dias	Seg 12/02/18	Qui 15/02/18	88%			
73		Sistema de Aterramento	2 dias	Seg 12/02/18	Ter 13/02/18	100%			
74		Abertura de piso e vala	4 hrs	Seg 12/02/18	Seg 12/02/18	100%			
75		Haste de aterramento	2 hrs	Seg 12/02/18	Seg 12/02/18	100%			
76		Solda exotérmica	2 hrs	Seg 12/02/18	Seg 12/02/18	100%			
77		Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Ter 13/02/18	Ter 13/02/18	100%			
78		Recomposição de piso	4 hrs	Ter 13/02/18	Ter 13/02/18	100%			
79		Descida a partir do aterramento	1 dia	Qua 14/02/18	Qua 14/02/18	100%			
80		Caixa de inspeção de parede	4 hrs	Qua 14/02/18	Qua 14/02/18	100%			
81		Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Qua 14/02/18	Qua 14/02/18	100%			
82		Conector de medição/Terminal apressão	2 hrs	Qua 14/02/18	Qua 14/02/18	100%			
83		Descida de interligação de captres	1 dia	Qui 15/02/18	Qui 15/02/18	50%			
84		Fixação de Perfis	4 hrs	Qui 15/02/18	Qui 15/02/18	50%			
85		Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Qui 15/02/18	Qui 15/02/18	50%			
86		Nº7 - Caldeira,Carregamento de Couro	5 dias	Sex 16/02/18	Qui 22/02/18	0%			
87		Sistema de Aterramento	3 dias	Sex 16/02/18	Ter 20/02/18	0%			
88		Abertura de piso e vala	8 hrs	Sex 16/02/18	Sex 16/02/18	0%			
89		Haste de aterramento	4 hrs	Seg 19/02/18	Seg 19/02/18	0%			
90		Solda exotérmica	4 hrs	Seg 19/02/18	Seg 19/02/18	0%			
91		Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Ter 20/02/18	Ter 20/02/18	0%			
92		Recomposição de piso	4 hrs	Ter 20/02/18	Ter 20/02/18	0%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
93		Descida a partir do aterramento	1 dia	Qua 21/02/18	Qua 21/02/18	0%			
94		Caixa de inspeção de parede	2 hrs	Qua 21/02/18	Qua 21/02/18	0%			
95		Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Qua 21/02/18	Qua 21/02/18	0%			
96		Conector de medição/Terminal apressão	4 hrs	Qua 21/02/18	Qua 21/02/18	0%			
97		Descida de interligação de captore	1 dia	Qui 22/02/18	Qui 22/02/18	0%			
98		Fixação de Perfis	4 hrs	Qui 22/02/18	Qui 22/02/18	0%			
99		Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Qui 22/02/18	Qui 22/02/18	0%			
100		Nº8 - Enfermaria,Seg.do Trabalho,Arq. Morto,Limp.Industrial	5 dias	Sex 23/02/18	Qui 01/03/18	90%			
101	✓	Sistema de Aterramento	2 dias	Sex 23/02/18	Seg 26/02/18	100%			
102	✓	Abertura de piso e vala	4 hrs	Sex 23/02/18	Sex 23/02/18	100%			
103	✓	Haste de aterramento	2 hrs	Sex 23/02/18	Sex 23/02/18	100%			
104	✓	Solda exotérmica	2 hrs	Sex 23/02/18	Sex 23/02/18	100%			
105	✓	Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Seg 26/02/18	Seg 26/02/18	100%			
106	✓	Recomposição de piso	4 hrs	Seg 26/02/18	Seg 26/02/18	100%			
107		Descida a partir do aterramento	1 dia	Ter 27/02/18	Ter 27/02/18	50%			
108		Caixa de inspeção de parede	4 hrs	Ter 27/02/18	Ter 27/02/18	50%			
109		Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Ter 27/02/18	Ter 27/02/18	50%			
110		Conector de medição/Terminal apressão	2 hrs	Ter 27/02/18	Ter 27/02/18	50%			
111	✓	Descida de interligação de captore	2 dias	Qua 28/02/18	Qui 01/03/18	100%			
112	✓	Fixação de Perfis	8 hrs	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	100%			
113	✓	Instalação de Terminai Aéreos	8 hrs	Qui 01/03/18	Qui 01/03/18	100%			
114		Nº9 - Industria,Sala dos Geradores e Compressores	13 dias	Sex 02/03/18	Ter 20/03/18	27%			
115		Sistema de Aterramento	7 dias	Sex 02/03/18	Seg 12/03/18	50%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
116		Abertura de piso e vala	16 hrs	Sex 02/03/18	Seg 05/03/18	50%			
117		Haste de aterramento	8 hrs	Ter 06/03/18	Ter 06/03/18	50%			
118		Solda exotérmica	8 hrs	Qua 07/03/18	Qua 07/03/18	50%			
119		Cabo de cobre nu #50	8 hrs	Qui 08/03/18	Qui 08/03/18	50%			
120		Recomposição de piso	16 hrs	Sex 09/03/18	Seg 12/03/18	50%			
121		Descida a partir do aterramento	2 dias	Ter 13/03/18	Qua 14/03/18	0%			
122		Caixa de inspeção de parede	4 hrs	Ter 13/03/18	Ter 13/03/18	0%			
123		Eletroduto/Perfis Alumínio	4 hrs	Ter 13/03/18	Ter 13/03/18	0%			
124		Conector de medição/Terminal apressão	8 hrs	Qua 14/03/18	Qua 14/03/18	0%			
125		Descida de interligação de captore	4 dias	Qui 15/03/18	Ter 20/03/18	0%			
126		Fixação de Perfis	16 hrs	Qui 15/03/18	Sex 16/03/18	0%			
127		Instalação de Terminai Aéreos	16 hrs	Seg 19/03/18	Ter 20/03/18	0%			
128		Nº10 - Manutenção	4 dias	Qua 21/03/18	Seg 26/03/18	50%			
129		Sistema de Aterramento	2 dias	Qua 21/03/18	Qui 22/03/18	100%			
130		Abertura de piso e vala	4 hrs	Qua 21/03/18	Qua 21/03/18	100%			
131		Haste de aterramento	2 hrs	Qua 21/03/18	Qua 21/03/18	100%			
132		Solda exotérmica	2 hrs	Qua 21/03/18	Qua 21/03/18	100%			
133		Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Qui 22/03/18	Qui 22/03/18	100%			
134		Recomposição de piso	4 hrs	Qui 22/03/18	Qui 22/03/18	100%			
135		Descida a partir do aterramento	1 dia	Sex 23/03/18	Sex 23/03/18	0%			
136		Caixa de inspeção de parede	4 hrs	Sex 23/03/18	Sex 23/03/18	0%			
137		Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Sex 23/03/18	Sex 23/03/18	0%			
138		Conector de medição/Terminal apressão	2 hrs	Sex 23/03/18	Sex 23/03/18	0%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
139		Descida de interligação de captore	1 dia	Seg 26/03/18	Seg 26/03/18	0%			
140		Fixação de Perfis	4 hrs	Seg 26/03/18	Seg 26/03/18	0%			
141		Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Seg 26/03/18	Seg 26/03/18	0%			
142		Nº11 - Portaria	2 dias	Ter 27/03/18	Qua 28/03/18	35%			
143		Sistema de Aterramento	1 dia	Ter 27/03/18	Ter 27/03/18	70%			
144		Abertura de piso e vala	2 hrs	Ter 27/03/18	Ter 27/03/18	70%			
145		Haste de aterramento	2 hrs	Ter 27/03/18	Ter 27/03/18	70%			
146		Solda exotérmica	1 hr	Ter 27/03/18	Ter 27/03/18	70%			
147		Cabo de cobre nu #50	1 hr	Ter 27/03/18	Ter 27/03/18	70%			
148		Recomposição de piso	2 hrs	Ter 27/03/18	Ter 27/03/18	70%			
149		Descida a partir do aterramento	0,5 dias	Qua 28/03/18	Qua 28/03/18	0%			
150		Caixa de inspeção de parede	1 hr	Qua 28/03/18	Qua 28/03/18	0%			
151		Eletroduto/Perfis Alumínio	1 hr	Qua 28/03/18	Qua 28/03/18	0%			
152		Conector de medição/Terminal apressão	2 hrs	Qua 28/03/18	Qua 28/03/18	0%			
153		Descida de interligação de captore	0,5 dias	Qua 28/03/18	Qua 28/03/18	0%			
154		Fixação de Perfis	2 hrs	Qua 28/03/18	Qua 28/03/18	0%			
155		Instalação de Terminai Aéreos	2 hrs	Qua 28/03/18	Qua 28/03/18	0%			
156	✓	Nº12 - Sala Curral,Sala Manutenção Civil,Crina,Casa Sal	5 dias	Qui 29/03/18	Qua 04/04/18	100%			
157	✓	Sistema de Aterramento	2 dias	Qui 29/03/18	Sex 30/03/18	100%			
158	✓	Abertura de piso e vala	4 hrs	Qui 29/03/18	Qui 29/03/18	100%			
159	✓	Haste de aterramento	2 hrs	Qui 29/03/18	Qui 29/03/18	100%			
160	✓	Solda exotérmica	2 hrs	Qui 29/03/18	Qui 29/03/18	100%			
161	✓	Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Sex 30/03/18	Sex 30/03/18	100%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
162	✓	Recomposição de piso	4 hrs	Sex 30/03/18	Sex 30/03/18	100%			
163	✓	Descida a partir do aterramento	1 dia	Seg 02/04/18	Seg 02/04/18	100%			
164	✓	Caixa de inspeção de parede	4 hrs	Seg 02/04/18	Seg 02/04/18	100%			
165	✓	Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Seg 02/04/18	Seg 02/04/18	100%			
166	✓	Conector de medição/Terminal apressão	2 hrs	Seg 02/04/18	Seg 02/04/18	100%			
167	✓	Descida de interligação de captore	2 dias	Ter 03/04/18	Qua 04/04/18	100%			
168	✓	Fixação de Perfis	8 hrs	Ter 03/04/18	Ter 03/04/18	100%			
169	✓	Instalação de Terminai Aéreos	8 hrs	Qua 04/04/18	Qua 04/04/18	100%			
170		Nº13 - Casa Sal e ETE	5 dias	Qui 05/04/18	Qua 11/04/18	80%			
171	✓	Sistema de Aterramento	3 dias	Qui 05/04/18	Seg 09/04/18	100%			
172	✓	Abertura de piso e vala	4 hrs	Qui 05/04/18	Qui 05/04/18	100%			
173	✓	Haste de aterramento	4 hrs	Qui 05/04/18	Qui 05/04/18	100%			
174	✓	Solda exotérmica	4 hrs	Sex 06/04/18	Sex 06/04/18	100%			
175	✓	Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Sex 06/04/18	Sex 06/04/18	100%			
176	✓	Recomposição de piso	8 hrs	Seg 09/04/18	Seg 09/04/18	100%			
177	✓	Descida a partir do aterramento	1 dia	Ter 10/04/18	Ter 10/04/18	100%			
178	✓	Caixa de inspeção de parede	2 hrs	Ter 10/04/18	Ter 10/04/18	100%			
179	✓	Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Ter 10/04/18	Ter 10/04/18	100%			
180	✓	Conector de medição/Terminal apressão	4 hrs	Ter 10/04/18	Ter 10/04/18	100%			
181		Descida de interligação de captore	1 dia	Qua 11/04/18	Qua 11/04/18	0%			
182		Fixação de Perfis	4 hrs	Qua 11/04/18	Qua 11/04/18	0%			
183		Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Qua 11/04/18	Qua 11/04/18	0%			
184		Nº14 - SIF,Restaurante,Balança	4 dias	Qui 12/04/18	Ter 17/04/18	35%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
185		Sistema de Aterramento	2 dias	Qui 12/04/18	Sex 13/04/18	70%			
186		Abertura de piso e vala	4 hrs	Qui 12/04/18	Qui 12/04/18	70%			
187		Haste de aterramento	2 hrs	Qui 12/04/18	Qui 12/04/18	70%			
188		Solda exotérmica	2 hrs	Qui 12/04/18	Qui 12/04/18	70%			
189		Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Sex 13/04/18	Sex 13/04/18	70%			
190		Recomposição de piso	4 hrs	Sex 13/04/18	Sex 13/04/18	70%			
191		Descida a partir do aterramento	1 dia	Seg 16/04/18	Seg 16/04/18	0%			
192		Caixa de inspeção de parede	4 hrs	Seg 16/04/18	Seg 16/04/18	0%			
193		Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Seg 16/04/18	Seg 16/04/18	0%			
194		Conector de medição/Terminal apressão	2 hrs	Seg 16/04/18	Seg 16/04/18	0%			
195		Descida de interligação de captors	1 dia	Ter 17/04/18	Ter 17/04/18	0%			
196		Fixação de Perfis	4 hrs	Ter 17/04/18	Ter 17/04/18	0%			
197		Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Ter 17/04/18	Ter 17/04/18	0%			
198		Nº15 - Subestação Fte da Unidade,Vestiário,Lavanderia	5 dias	Qua 18/04/18	Ter 24/04/18	30%			
199		Sistema de Aterramento	3 dias	Qua 18/04/18	Sex 20/04/18	50%			
200		Abertura de piso e vala	4 hrs	Qua 18/04/18	Qua 18/04/18	50%			
201		Haste de aterramento	4 hrs	Qua 18/04/18	Qua 18/04/18	50%			
202		Solda exotérmica	4 hrs	Qui 19/04/18	Qui 19/04/18	50%			
203		Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Qui 19/04/18	Qui 19/04/18	50%			
204		Recomposição de piso	8 hrs	Sex 20/04/18	Sex 20/04/18	50%			
205		Descida a partir do aterramento	1 dia	Seg 23/04/18	Seg 23/04/18	0%			
206		Caixa de inspeção de parede	2 hrs	Seg 23/04/18	Seg 23/04/18	0%			
207		Eletroduto/Perfis Alumínio	2 hrs	Seg 23/04/18	Seg 23/04/18	0%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
208		Conector de medição/Terminal apressão	4 hrs	Seg 23/04/18	Seg 23/04/18	0%			
209		Descida de interligação de captore	1 dia	Ter 24/04/18	Ter 24/04/18	0%			
210		Fixação de Perfis	4 hrs	Ter 24/04/18	Ter 24/04/18	0%			
211		Instalação de Terminai Aéreos	4 hrs	Ter 24/04/18	Ter 24/04/18	0%			
212		Nº18 - Engenharia Confecção da Documentação	8 dias	Qua 25/04/18	Sex 04/05/18	0%			
213		Sistema de Aterramento	4 dias	Qua 25/04/18	Seg 30/04/18	0%			
214		Abertura de piso e vala	16 hrs	Qua 25/04/18	Qui 26/04/18	0%			
215		Haste de aterramento	2 hrs	Sex 27/04/18	Sex 27/04/18	0%			
216		Solda exotérmica	2 hrs	Sex 27/04/18	Sex 27/04/18	0%			
217		Cabo de cobre nu #50	4 hrs	Sex 27/04/18	Sex 27/04/18	0%			
218		Recomposição de piso	8 hrs	Seg 30/04/18	Seg 30/04/18	0%			
219		Descida a partir do aterramento	2 dias	Ter 01/05/18	Qua 02/05/18	0%			
220		Caixa de inspeção de parede	8 hrs	Ter 01/05/18	Ter 01/05/18	0%			
221		Eletroduto/Perfis Alumínio	4 hrs	Qua 02/05/18	Qua 02/05/18	0%			
222		Conector de medição/Terminal apressão	4 hrs	Qua 02/05/18	Qua 02/05/18	0%			
223		Descida de interligação de captore	2 dias	Qui 03/05/18	Sex 04/05/18	0%			
224		Fixação de Perfis	8 hrs	Qui 03/05/18	Qui 03/05/18	0%			
225		Instalação de Terminai Aéreos	8 hrs	Sex 04/05/18	Sex 04/05/18	0%			
226		Nº19 - Engenharia Revisão da Documentação	2 dias	Seg 07/05/18	Ter 08/05/18	0%			
227		Sistema de Aterramento	1 dia	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18	0%			
228		Abertura de piso e vala	2 hrs	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18	0%			
229		Haste de aterramento	2 hrs	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18	0%			
230		Solda exotérmica	1 hr	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18	0%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta


Id		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	14/Jan/18		
							S	D	
231		Cabo de cobre nu #50	1 hr	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18	0%			
232		Recomposição de piso	2 hrs	Seg 07/05/18	Seg 07/05/18	0%			
233		Descida a partir do aterramento	0,5 dias	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	0%			
234		Caixa de inspeção de parede	2 hrs	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	0%			
235		Eletroduto/Perfis Alumínio	1 hr	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	0%			
236		Conector de medição/Terminal apressão	1 hr	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	0%			
237		Descida de interligação de captors	0,5 dias	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	0%			
238		Fixação de Perfis	2 hrs	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	0%			
239		Instalação de Terminai Aéreos	2 hrs	Ter 08/05/18	Ter 08/05/18	0%			

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

[illegible]

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

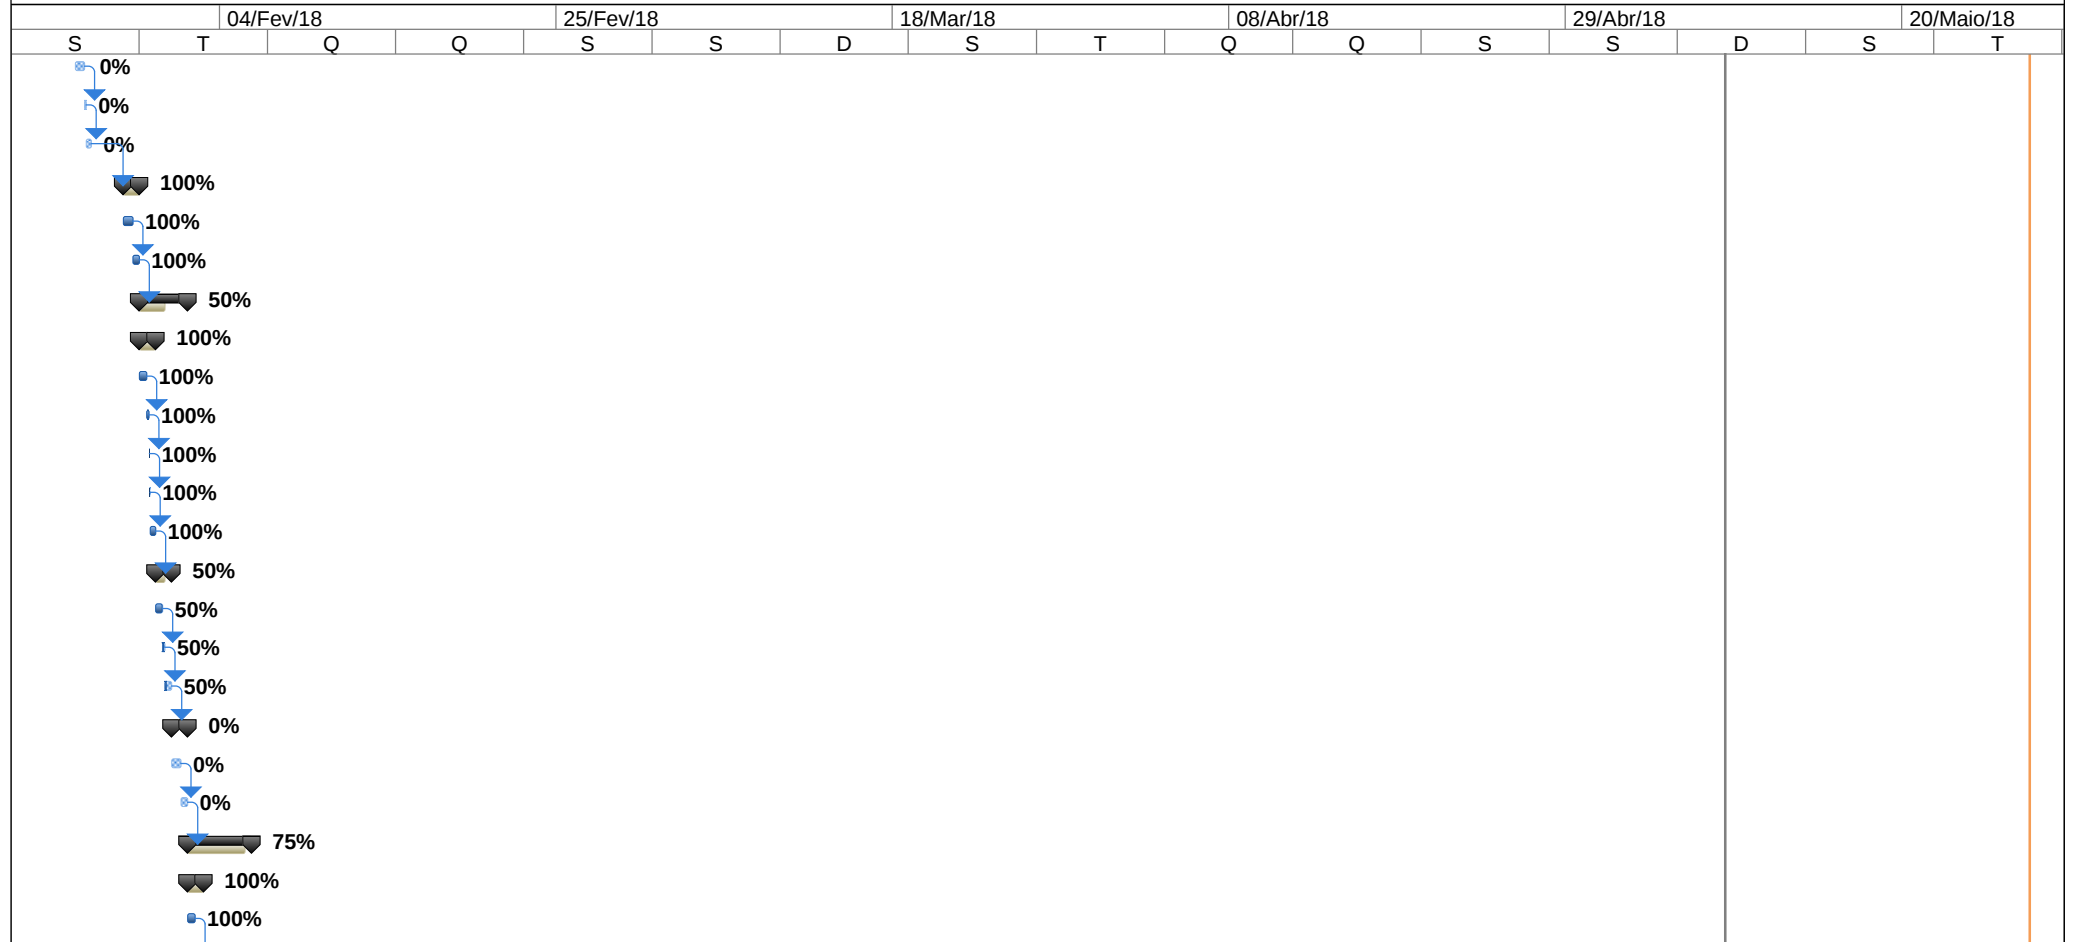


Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

[illegible]


Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

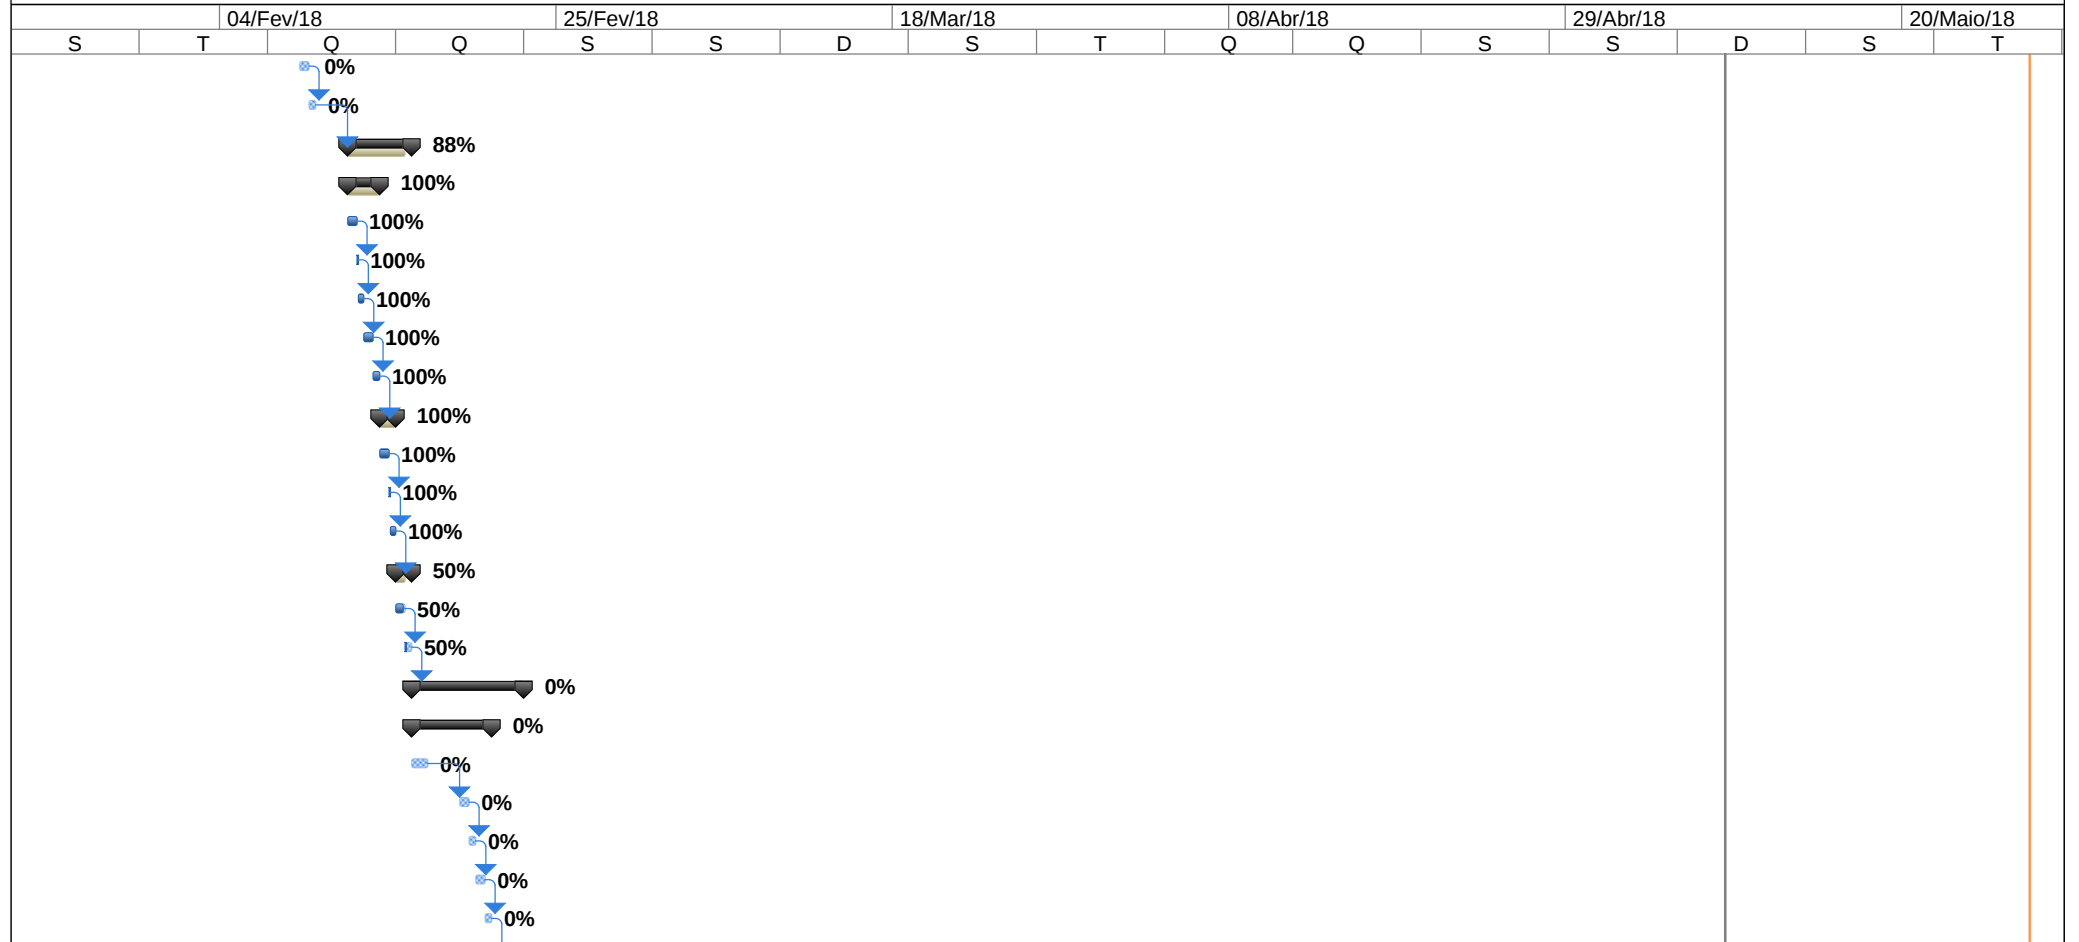


Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

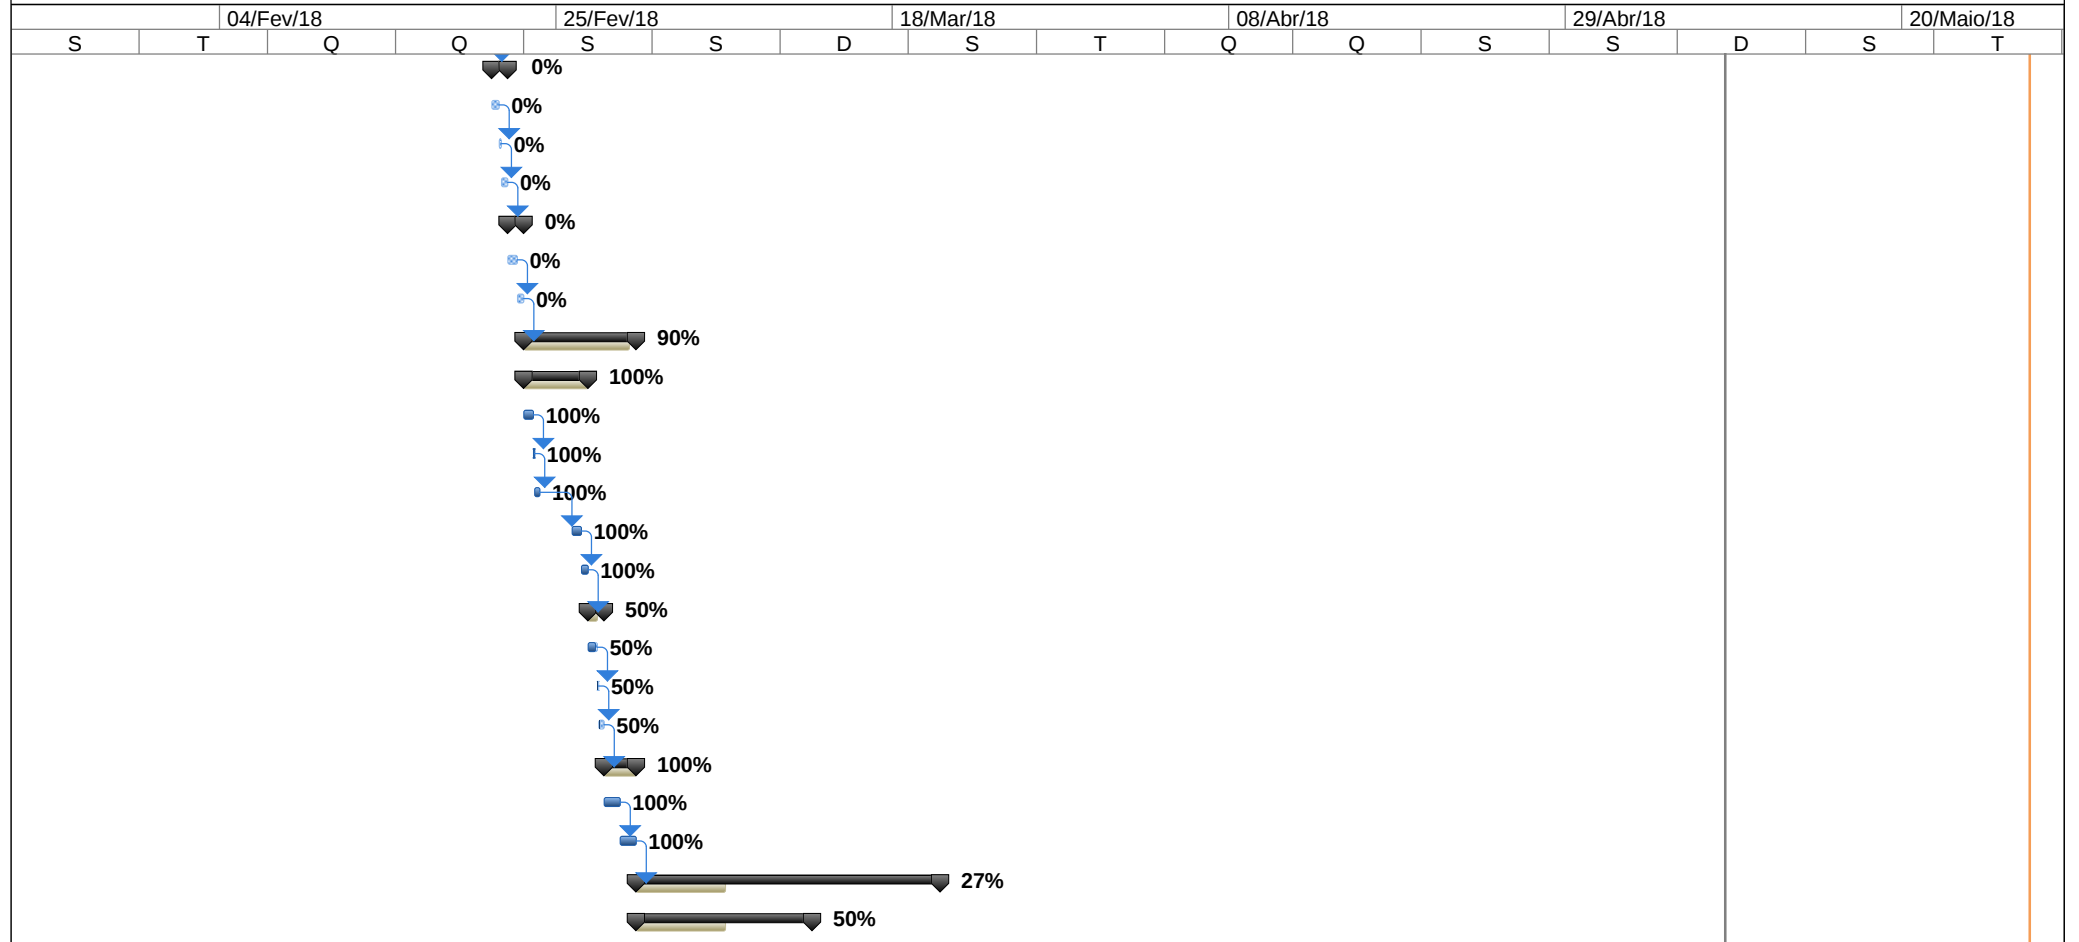


Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

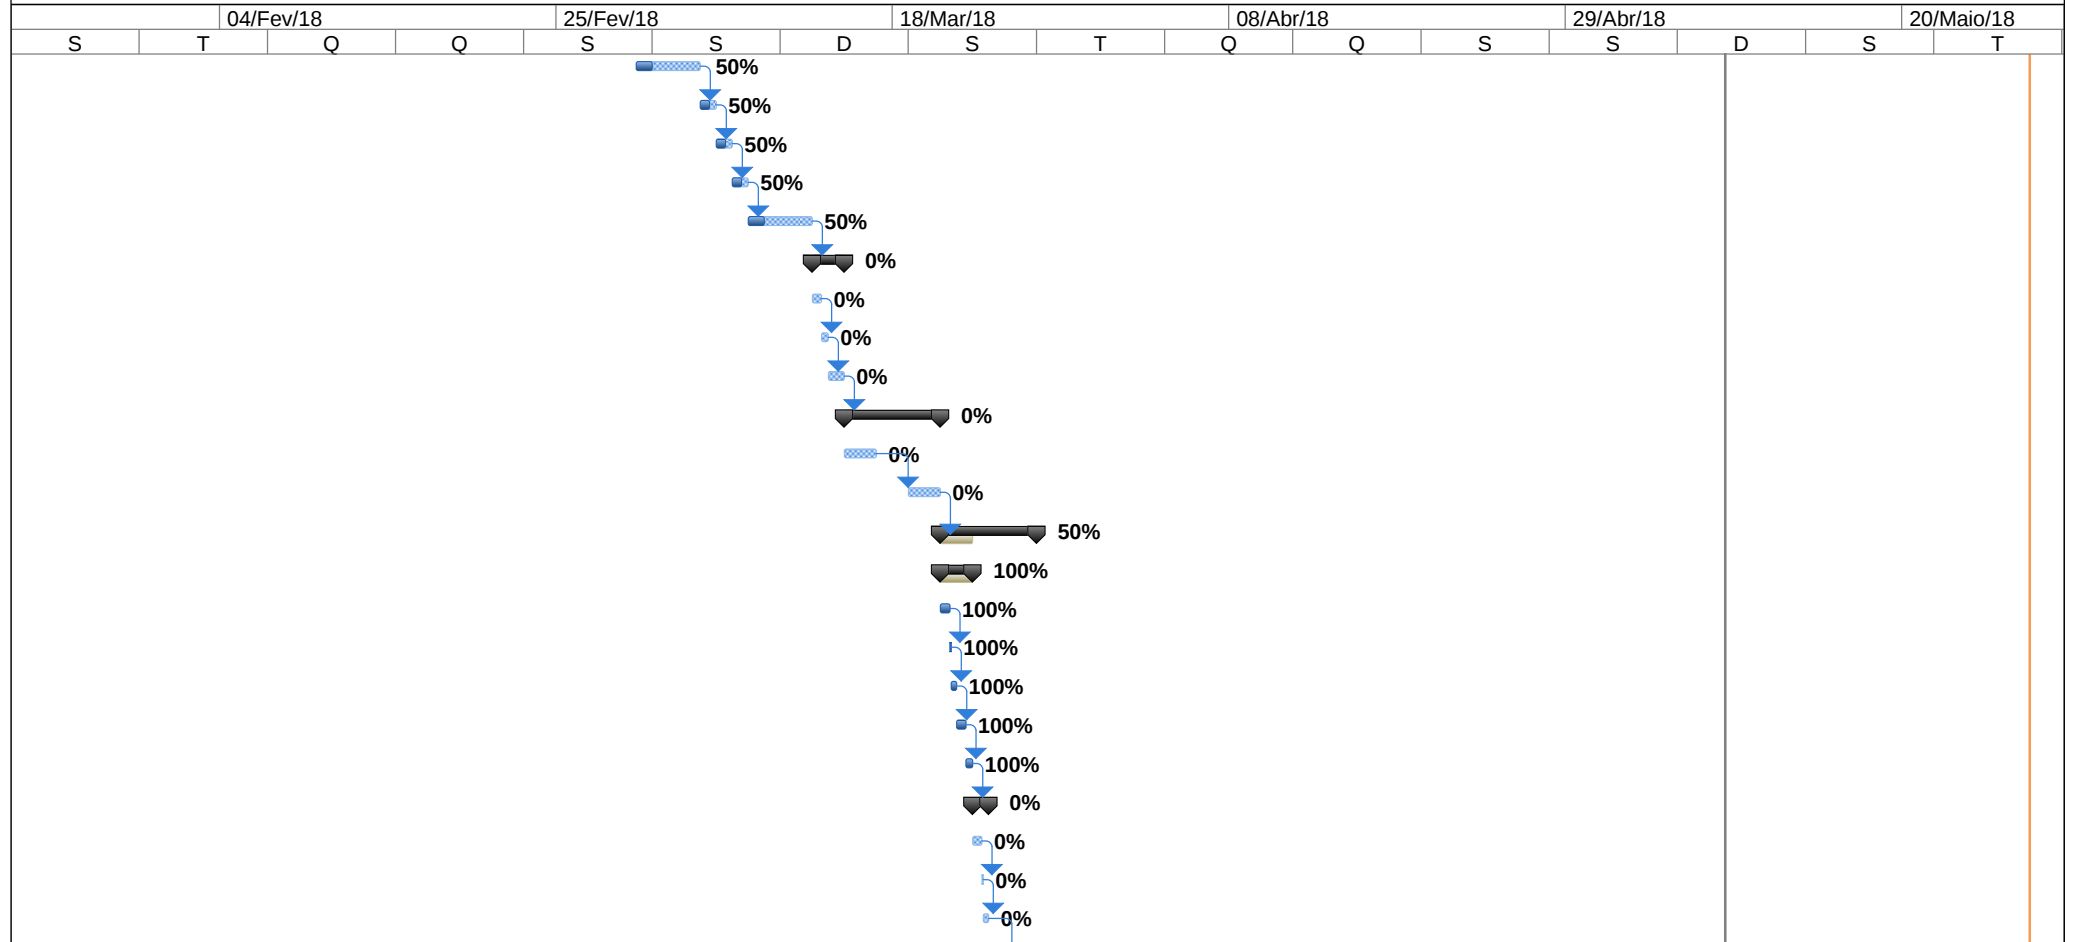


Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

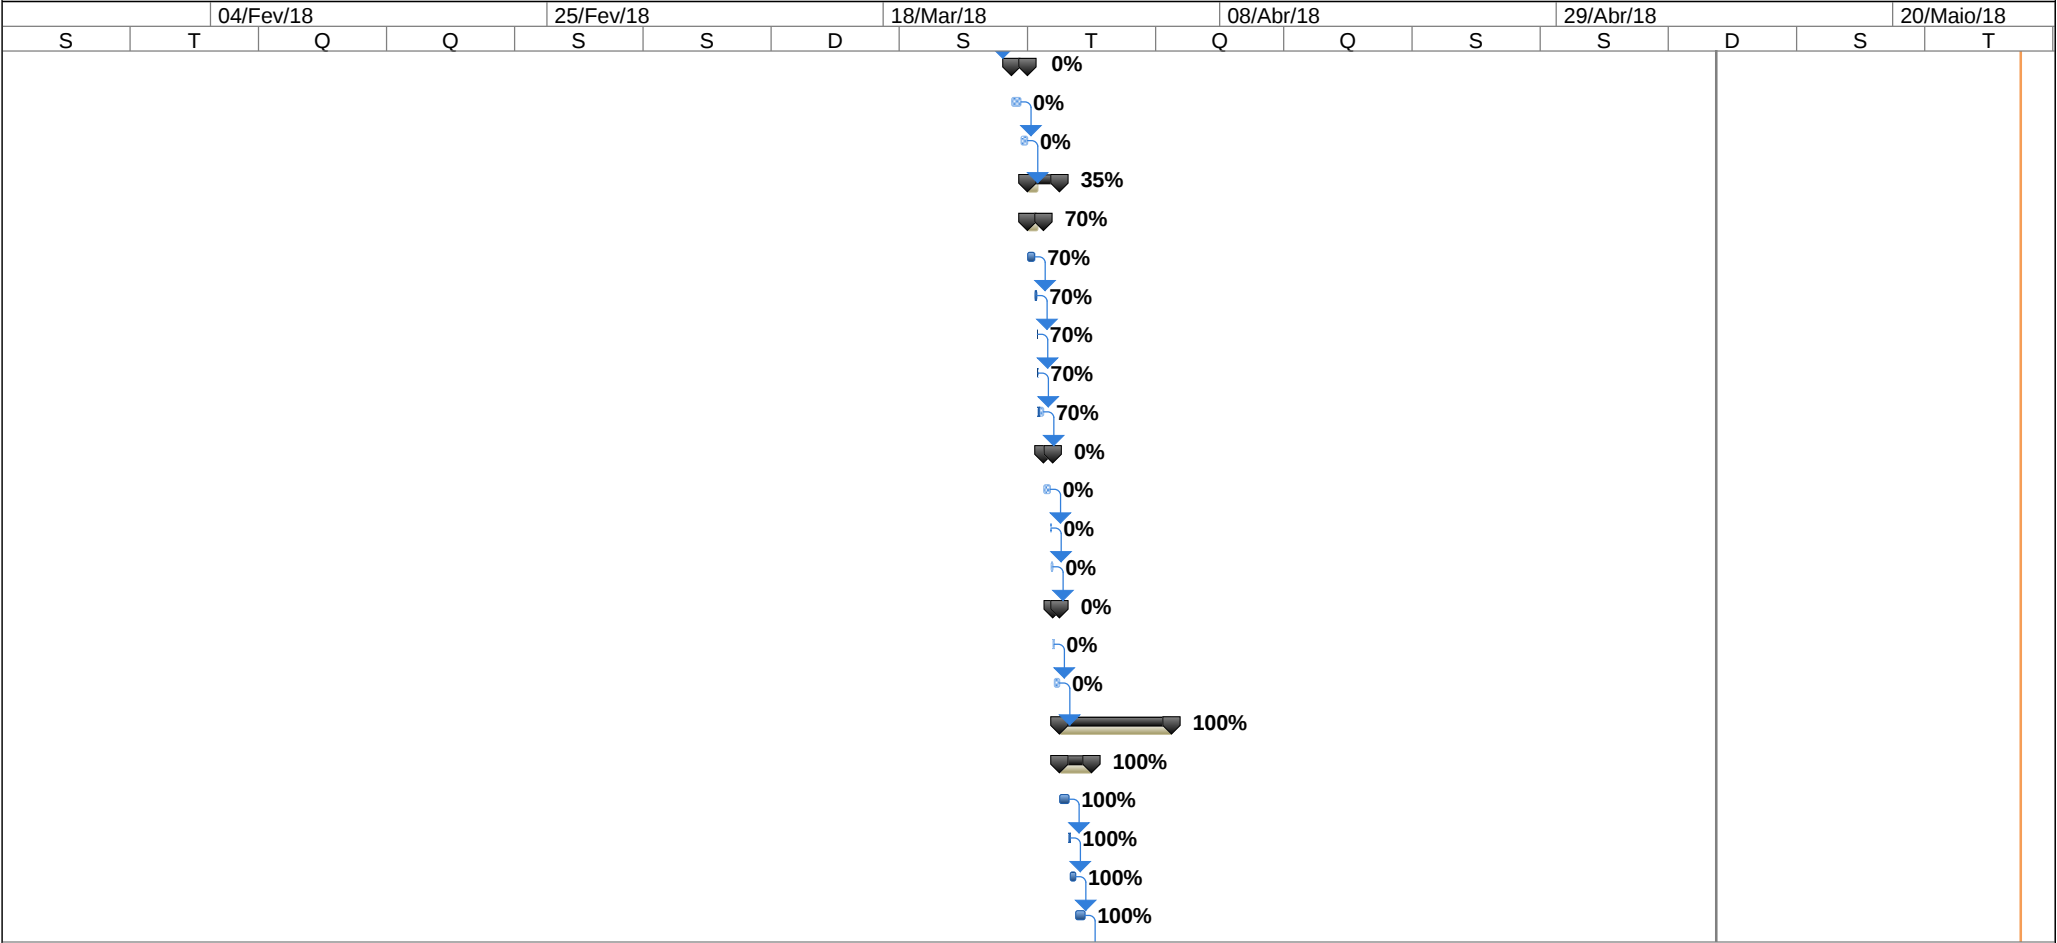


Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

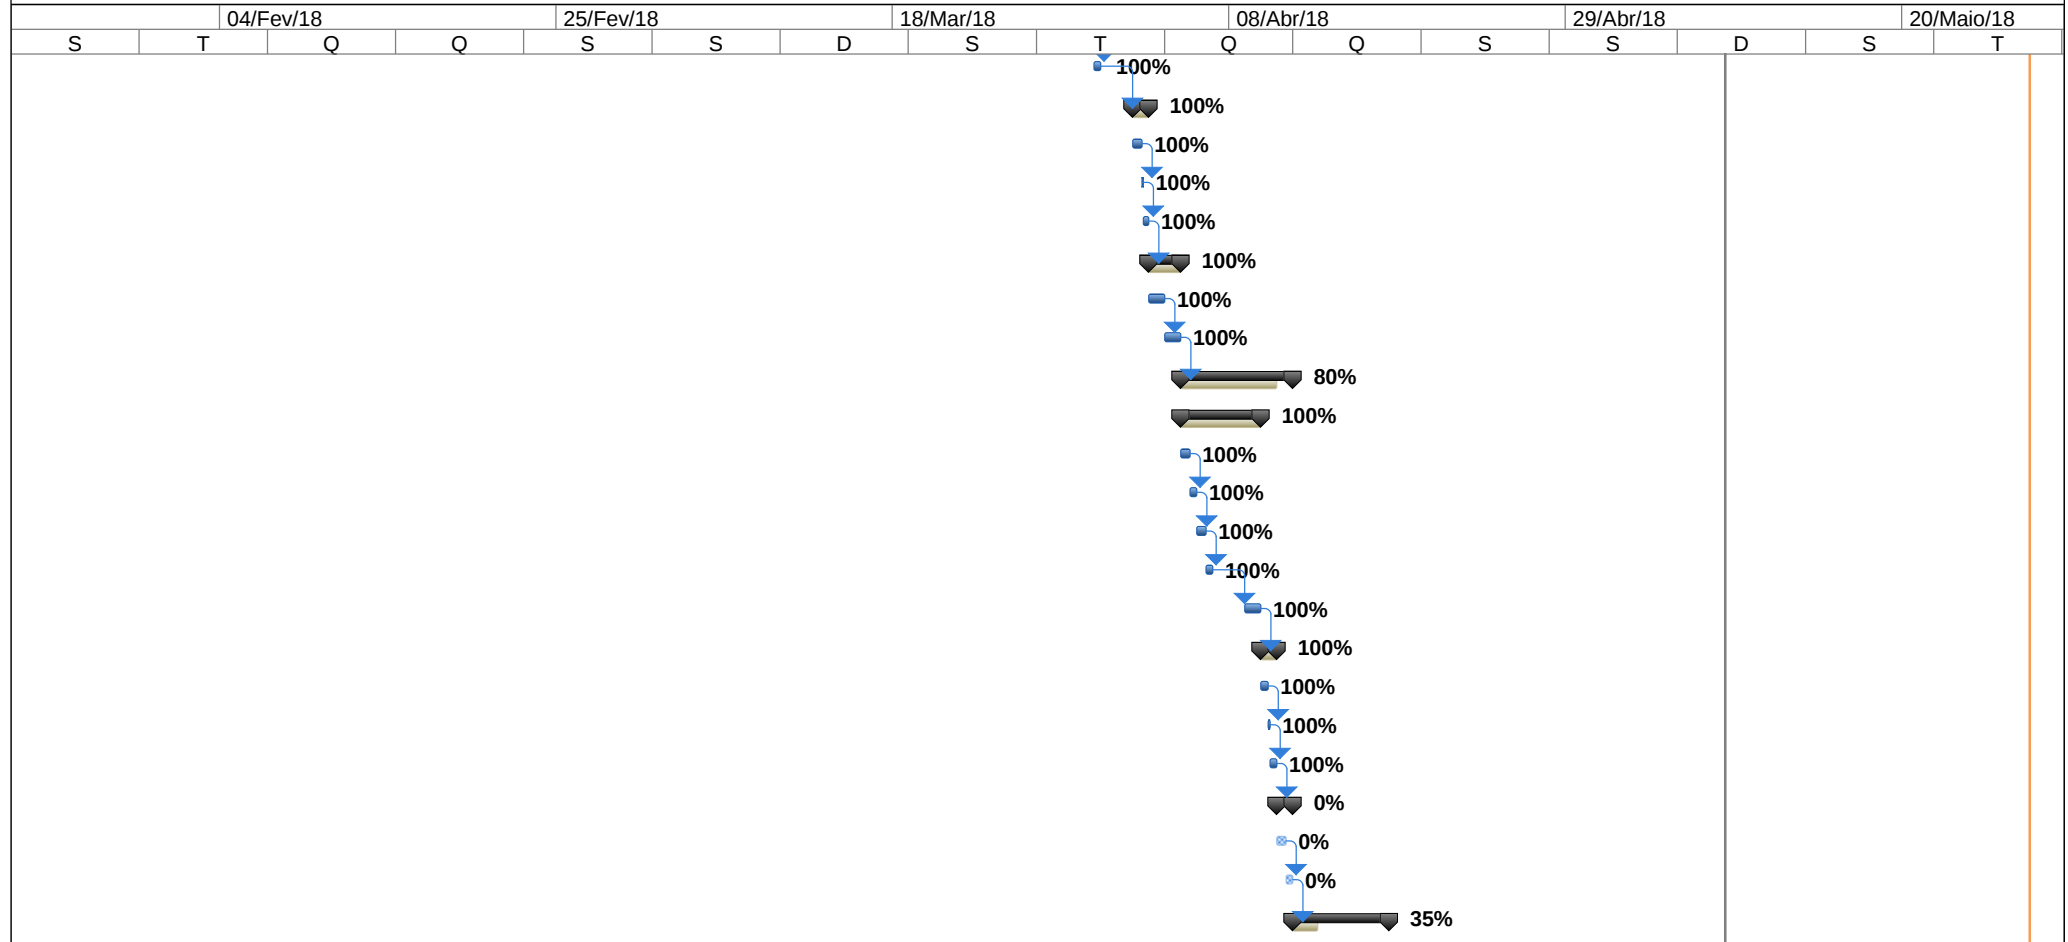


Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

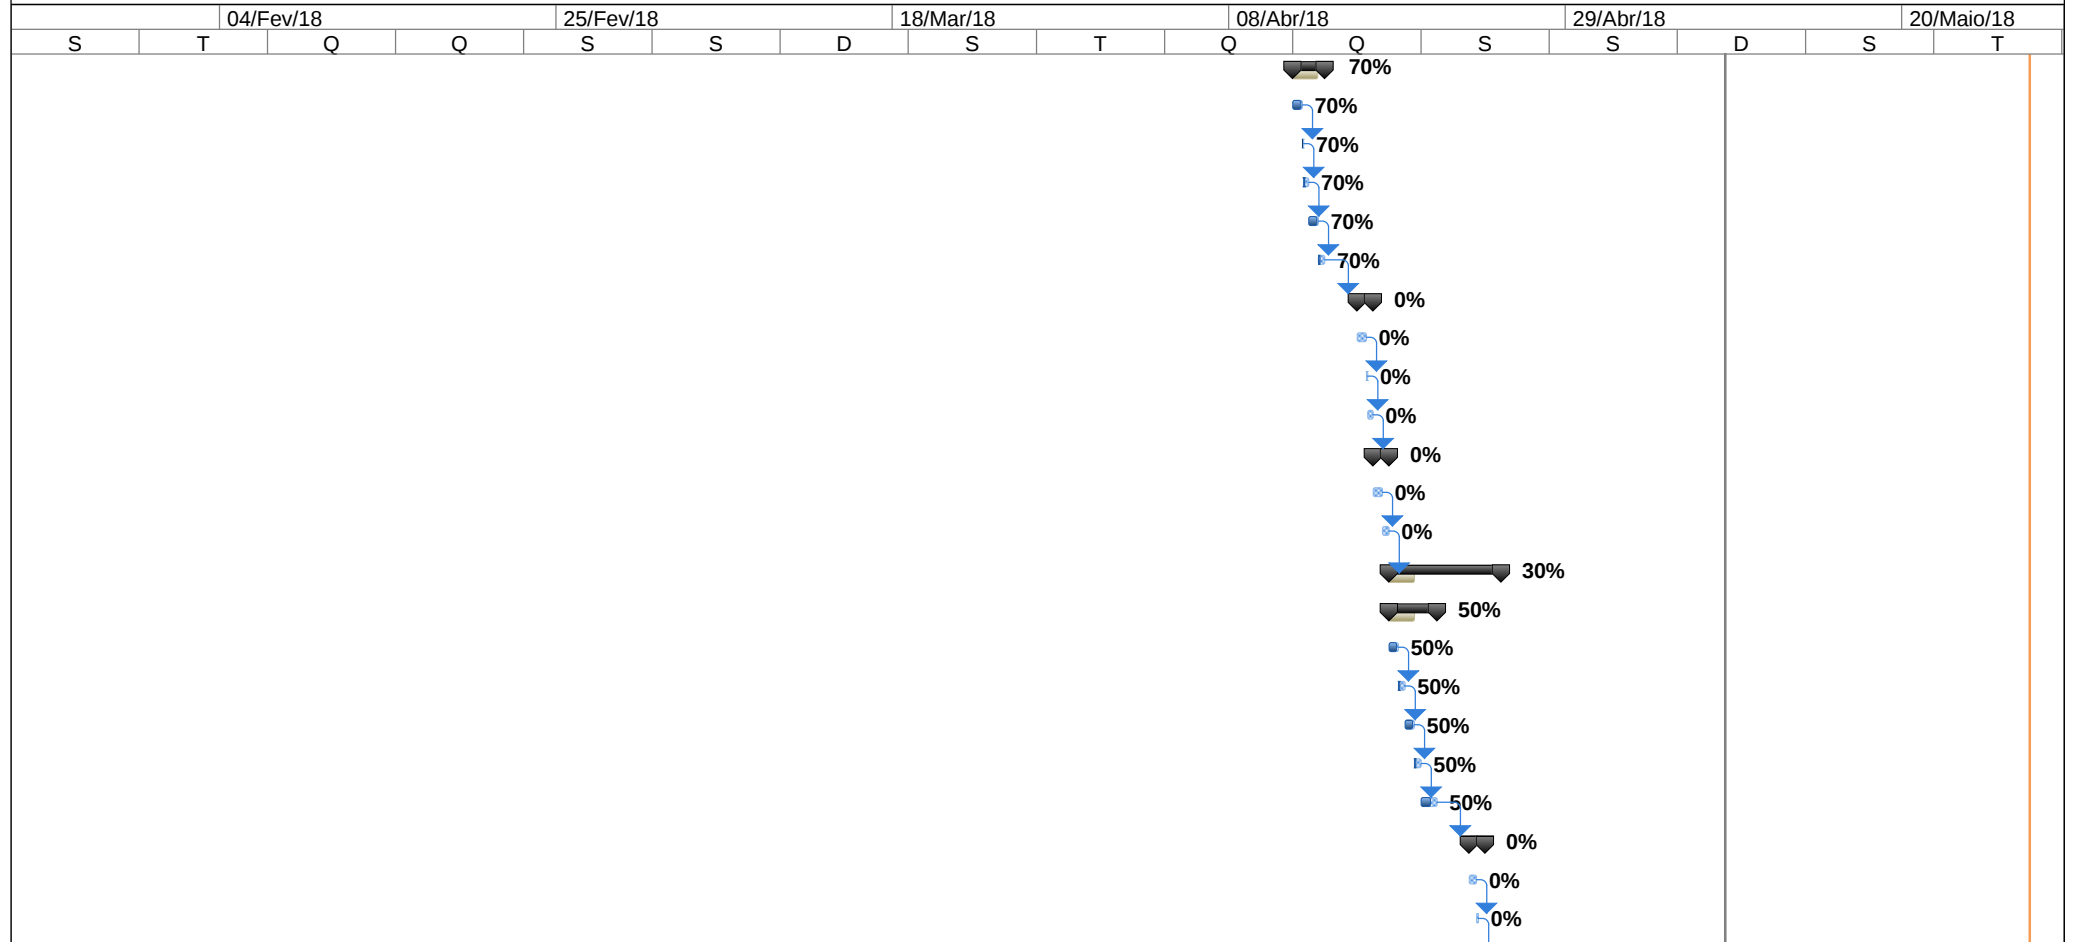


Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

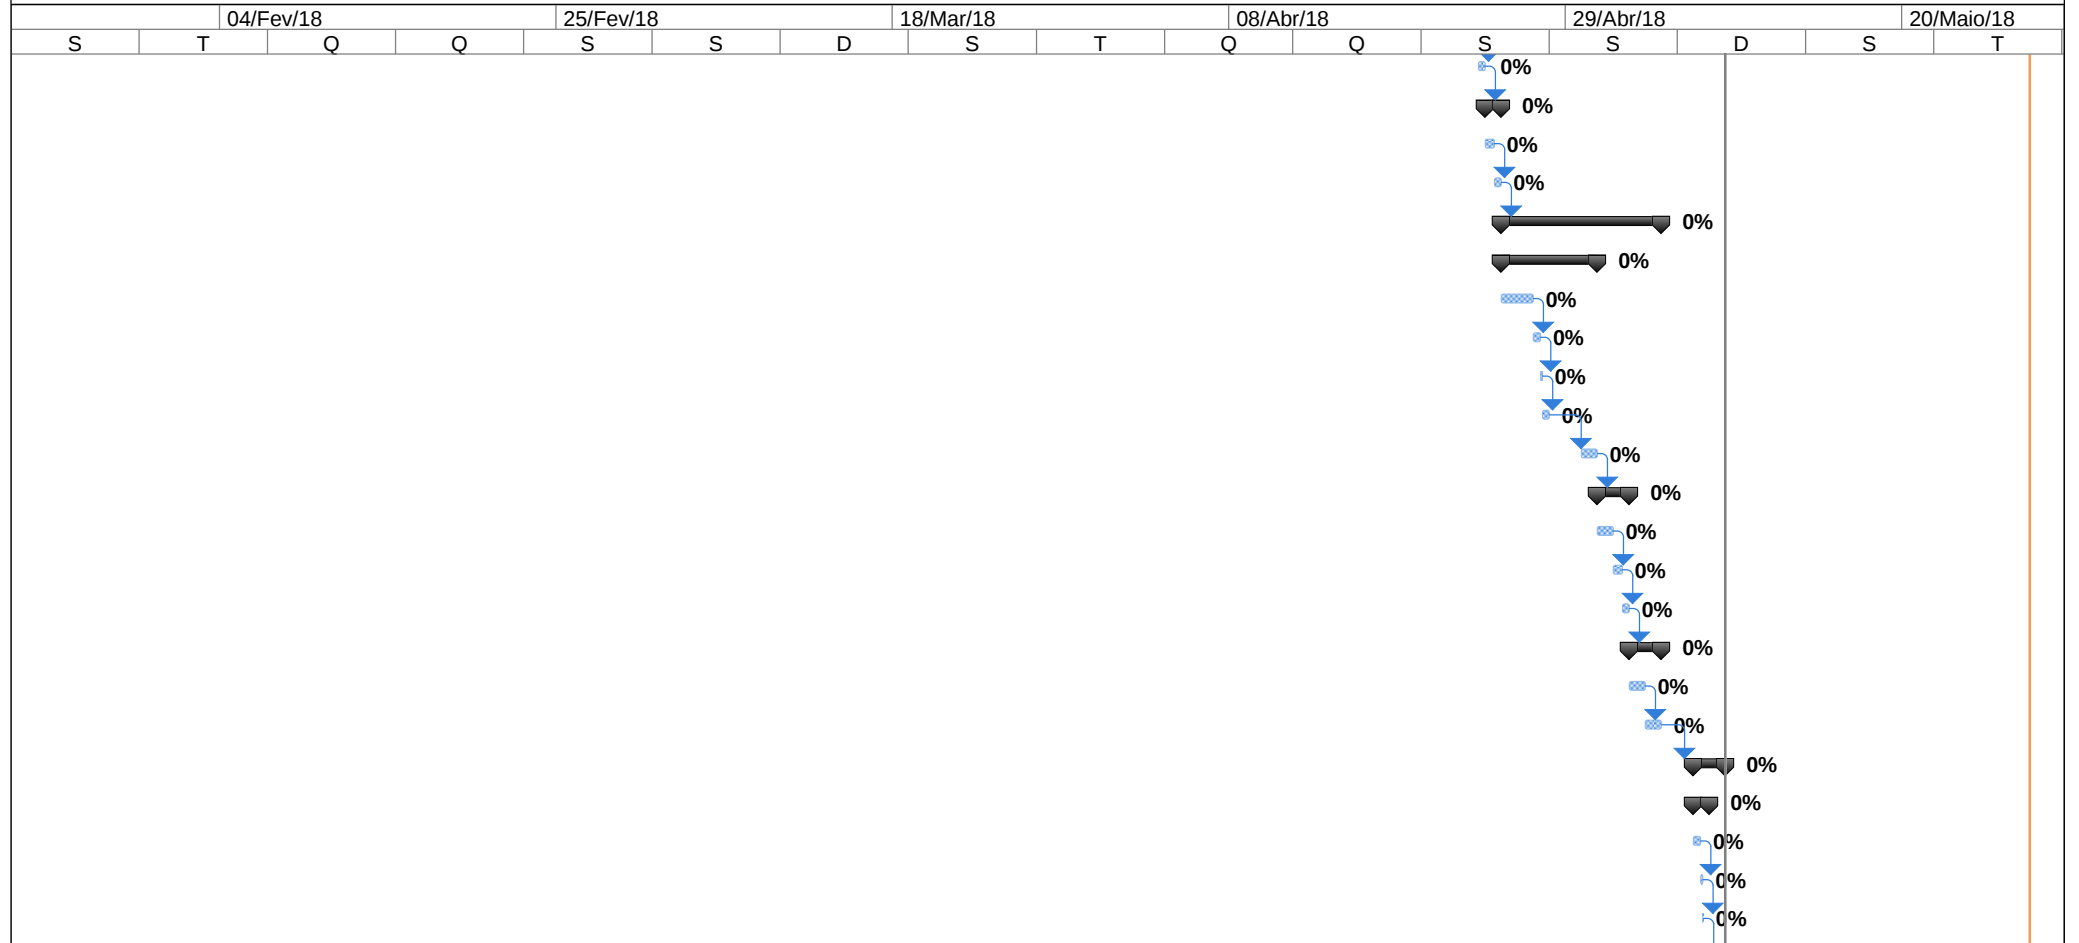

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	

CRONOGRAMA - JBS Pedra Preta

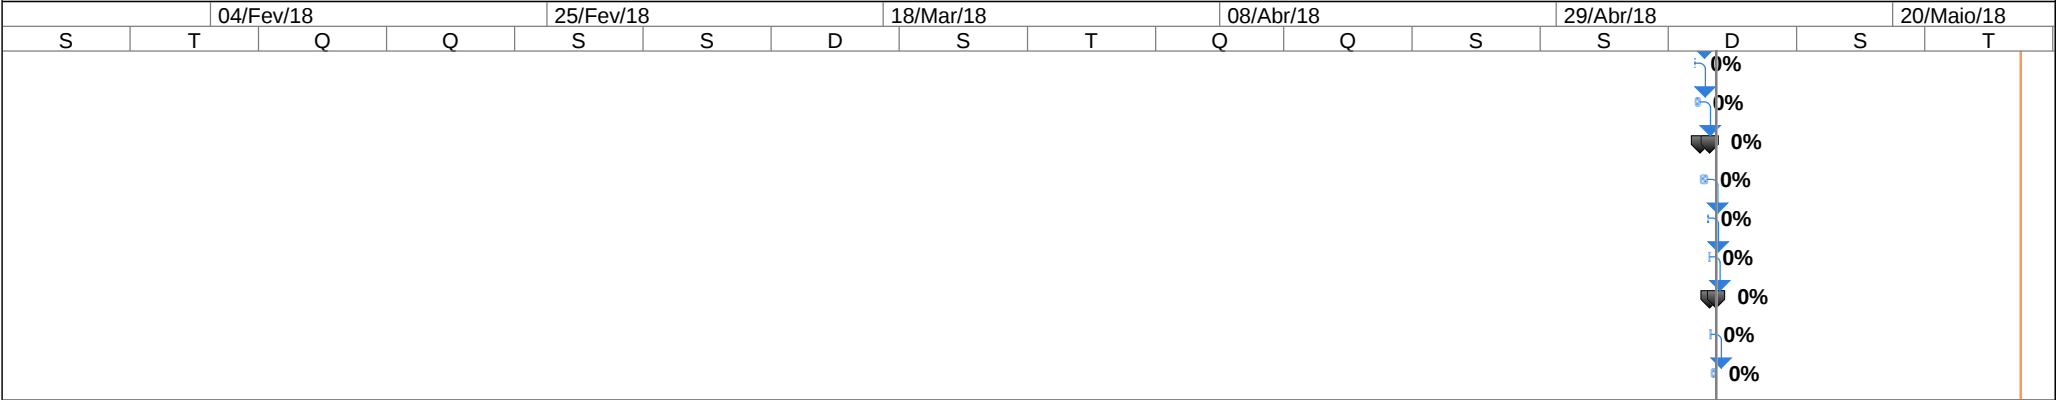

Crítica		Somente término		Resumo Manual	
Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do projeto	
Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas externas	
Tarefa		Divisão da Linha de Base		Etapa externa	
Divisão		Etapa da Linha de Base		Tarefa Inativa	
Andamento da Tarefa		Etapa		Etapa Inativa	
Tarefa Manual		Andamento do Resumo		Resumo Inativo	
Somente início		Resumo		Data limite	
